


Act ID	Description	Original Duration	Early Start	Early Finish	Activity Owner	JUL 31	AUG 07	AUG 14	AUG 21	AUG 28	SEP 04
PARKING STRUCTURE											
GARAGE LEVEL 2 SLAB ON DECK											
POUR #3/4 DECK											
004230	STRIP FORMWORK & RESHORE - L2 POUR 3/4	2	31JUL06 A	02AUG06	JJA						
POUR #4/4 DECK											
004185	REBAR/P.T. - L2 POUR 4/4	4	28JUL06 A	03AUG06	JJA						
004145	EMBEDS - L2 POUR 4/4	3	31JUL06 A	03AUG06	JJA						
004155	ELECTRICAL - L2 POUR 4/4	3	31JUL06 A	03AUG06	MM						
004195	SLAB ON DECK INSPECTIONS - L2 POUR 4/4	1	03AUG06	03AUG06	TCCO						
004205	POUR SLAB ON DECK - L2 POUR 4/4	1	03AUG06	03AUG06	JJA						
004215	CURE DECK (& 3D CYL BREAKS) - L2 POUR 4/4	3	04AUG06	08AUG06	JJA						
004225	STRESS P.T. & INSPECTION - L2 POUR 4/4	1	09AUG06	09AUG06	JJA						
004235	STRIP FORMWORK & RESHORE - L2 POUR 4/4	3	10AUG06	14AUG06	JJA						
GARAGE LEVEL 3 SLAB ON DECK											
POUR #1/4 DECK											
004240	FORM DECK - L3 POUR 1/4	4	28JUL06 A	04AUG06	JJA						
004250	SURVEY CONTROL - L3 POUR 1/4	1	07AUG06	07AUG06	JJA						
004260	EMBEDS - L3 POUR 1/4	3	08AUG06	10AUG06	JJA						
004270	ELECTRICAL - L3 POUR 1/4	3	08AUG06	10AUG06	MM						
004280	LAYOUT, INSERTS & SET DRAINS- L3 POUR 1/4	2	08AUG06	09AUG06	ACCO						
004290	SET INSERTS - L3 POUR 1/4	1	08AUG06	08AUG06	WFP						
004300	REBAR/P.T. - L3 POUR 1/4	4	08AUG06	11AUG06	JJA						
004310	SLAB ON DECK INSPECTIONS - L3 POUR 1/4	1	11AUG06	11AUG06	TCCO						
004320	POUR SLAB ON DECK - L3 POUR 1/4	1	15AUG06	15AUG06	JJA						
004330	CURE DECK (& 3D CYL BREAKS) - L3 POUR 1/4	3	16AUG06	18AUG06	JJA						
004340	STRESS P.T. & INSPECTION - L3 POUR 1/4	1	21AUG06	21AUG06	JJA						
004350	STRIP FORMWORK & RESHORE - L3 POUR 1/4	3	22AUG06	24AUG06	JJA						
POUR #2/4 DECK											
004360	FORM DECK - L3 POUR 2/4	4	07AUG06	10AUG06	JJA						
004370	SURVEY CONTROL - L3 POUR 2/4	1	11AUG06	11AUG06	JJA						
004380	EMBEDS - L3 POUR 2/4	3	14AUG06	16AUG06	JJA						
004390	ELECTRICAL - L3 POUR 2/4	3	14AUG06	16AUG06	MM						
004400	LAYOUT, INSERTS & SET DRAINS- L3 POUR 2/4	2	14AUG06	15AUG06	ACCO						
004410	SET INSERTS - L3 POUR 2/4	1	14AUG06	14AUG06	WFP						
004420	REBAR/P.T. - L3 POUR 2/4	5	15AUG06	19AUG06	JJA						
004430	SLAB ON DECK INSPECTIONS - L3 POUR 2/4	1	18AUG06	21AUG06	TCCO						
004440	POUR SLAB ON DECK - L3 POUR 2/4	1	21AUG06	22AUG06	JJA						
004450	CURE DECK (& 3D CYL BREAKS) - L3 POUR 2/4	3	22AUG06	25AUG06	JJA						
004460	STRESS P.T. & INSPECTION - L3 POUR 2/4	1	25AUG06	28AUG06	JJA						
004470	STRIP FORMWORK & RESHORE - L3 POUR 2/4	3	28AUG06	31AUG06	JJA						
POUR #3/4 DECK											
004480	FORM DECK - L3 POUR 3/4	4	11AUG06	16AUG06	JJA						
004490	SURVEY CONTROL - L3 POUR 3/4	1	17AUG06	17AUG06	JJA						
004500	EMBEDS - L3 POUR 3/4	3	18AUG06	22AUG06	JJA						
004510	ELECTRICAL - L3 POUR 3/4	3	18AUG06	22AUG06	MM						
004520	LAYOUT, INSERTS & SET DRAINS- L3 POUR 3/4	2	18AUG06	21AUG06	ACCO						
004530	SET INSERTS - L3 POUR 3/4	1	18AUG06	18AUG06	WFP						
004540	REBAR/P.T. - L3 POUR 4/4	5	21AUG06	25AUG06	JJA						
004550	SLAB ON DECK INSPECTIONS - L3 POUR 3/4	1	25AUG06	25AUG06	TCCO						
004560	POUR SLAB ON DECK - L3 POUR 3/4	1	28AUG06	28AUG06	JJA						
004570	CURE DECK (& 3D CYL BREAKS) - L3 POUR 3/4	3	29AUG06	31AUG06	JJA						
004580	STRESS P.T. & INSPECTION - L3 POUR 3/4	1	01SEP06	01SEP06	JJA						
004590	STRIP FORMWORK & RESHORE - L3 POUR 3/4	3	05SEP06	07SEP06	JJA						
POUR #4/4 DECK											
004485	FORM DECK - L3 POUR 4/4	4	17AUG06	22AUG06	JJA						
004495	SURVEY CONTROL - L3 POUR 4/4	1	23AUG06	23AUG06	JJA						
004505	EMBEDS - L3 POUR 4/4	3	24AUG06	28AUG06	JJA						
004515	ELECTRICAL - L3 POUR 4/4	3	24AUG06	28AUG06	MM						
004525	LAYOUT, INSERTS & SET DRAINS- L3 POUR 4/4	2	24AUG06	25AUG06	ACCO						
004535	SET INSERTS - L3 POUR 4/4	1	24AUG06	24AUG06	WFP						

Start date 13FEB06
 Finish date 28NOV06
 Data date 07AUG06
 Run date 02AUG06
 Page number 1A
 © Primavera Systems, Inc.

MILLS PENINSULA HEALTH SERVICES
 MILLS PENINSULA HOSPITAL PARKING STR

Early bar
 Target bar
 Progress bar
 Summary bar
 Start milestone point
 Finish milestone point

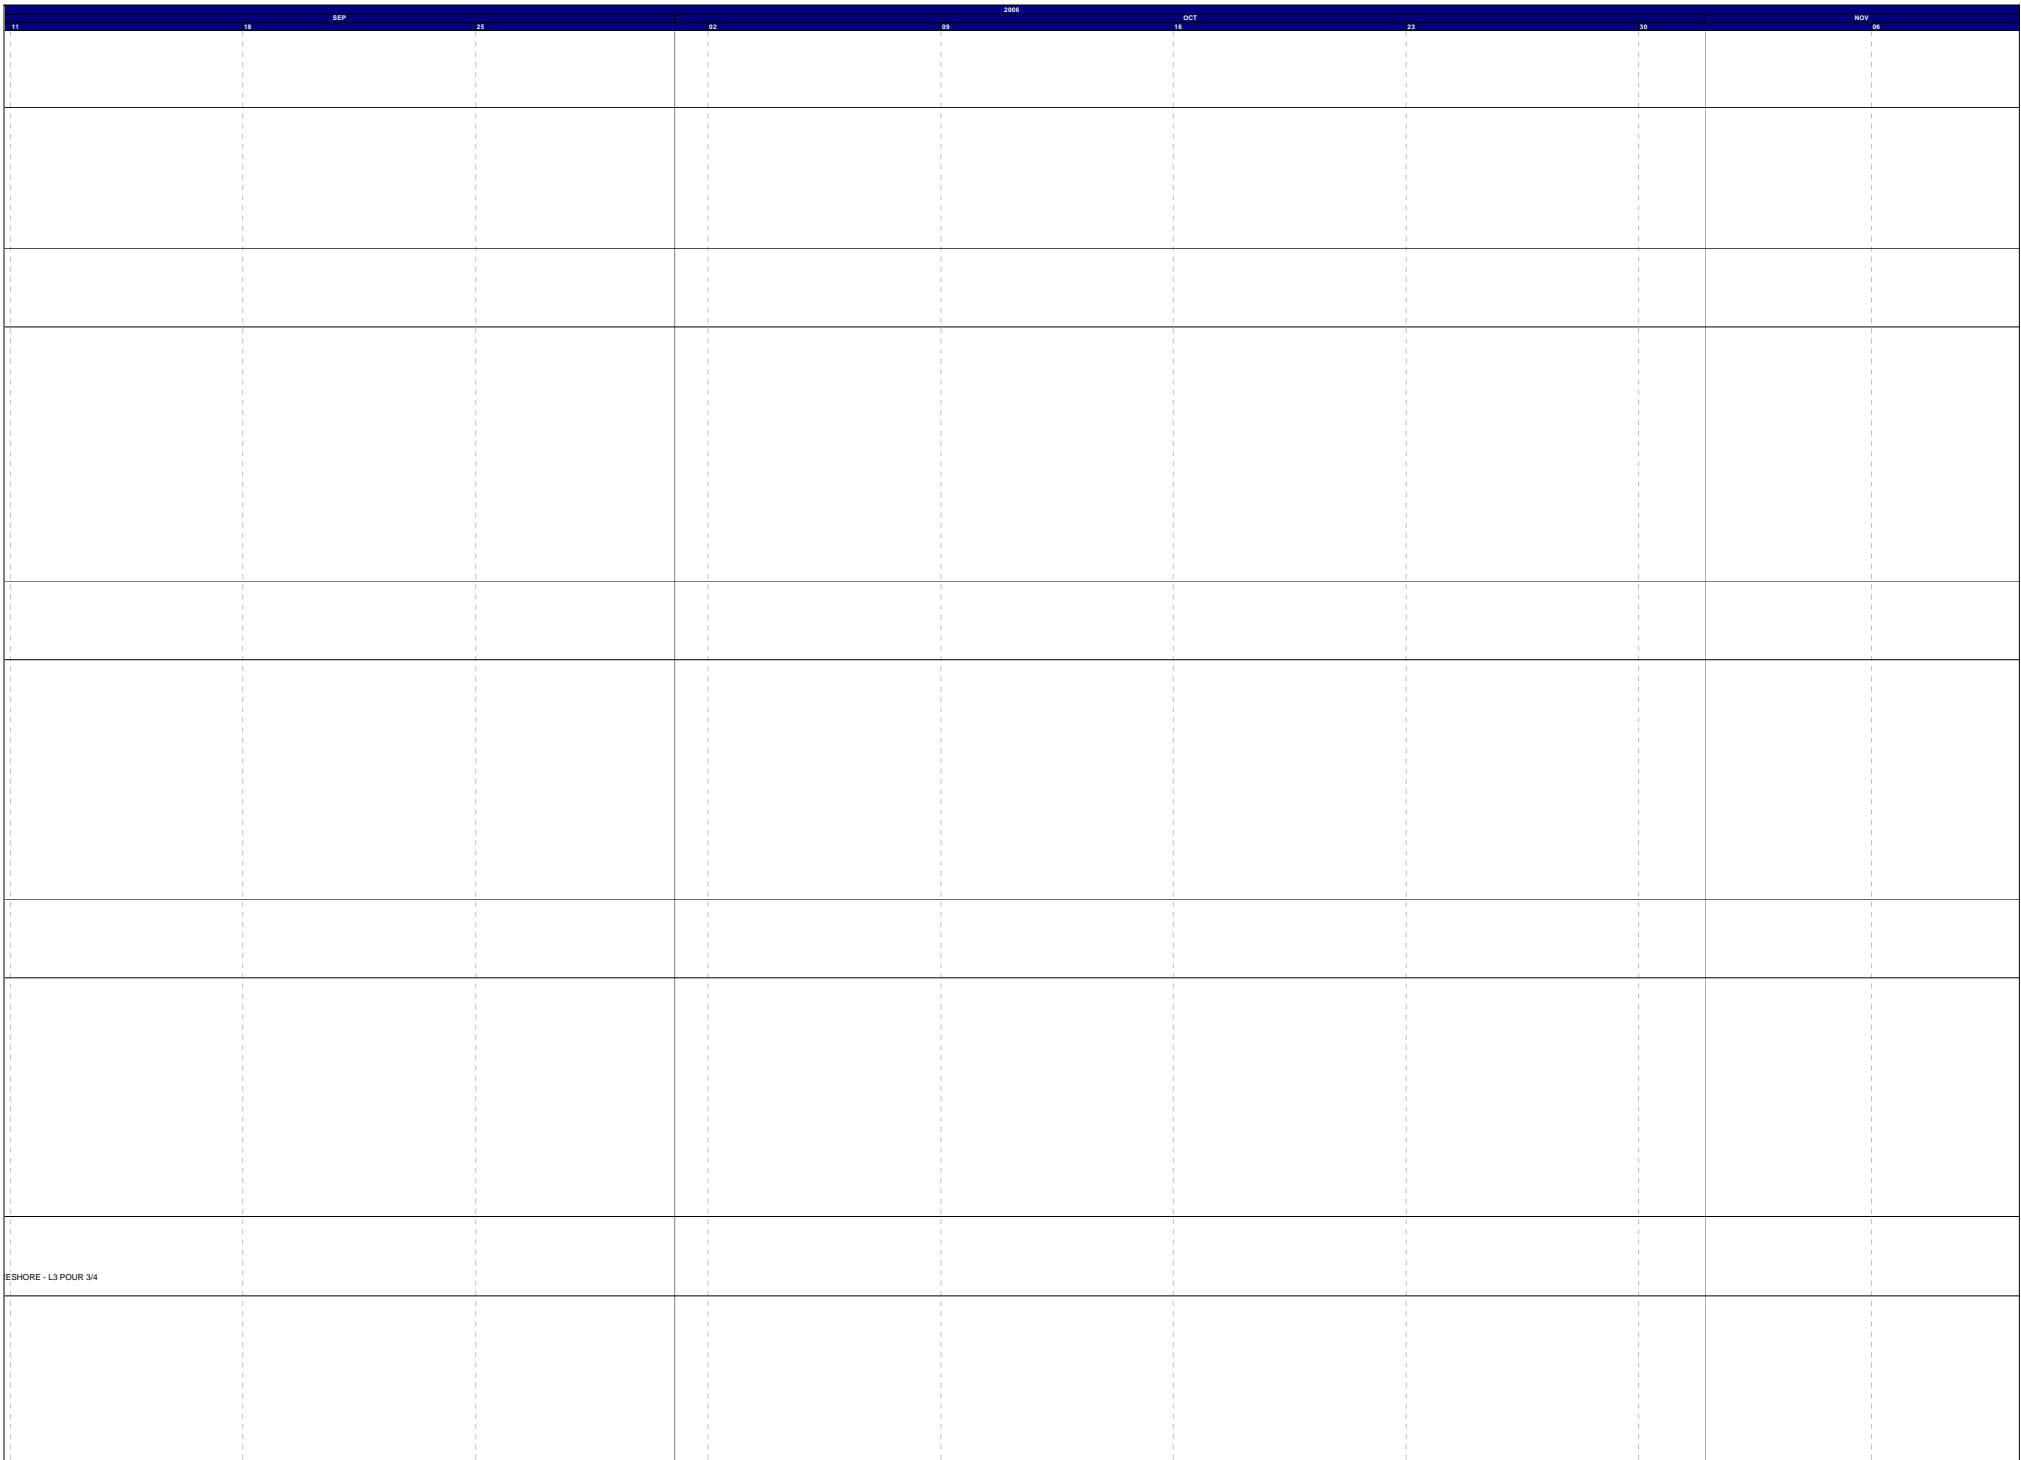

ESHORE - L3 POUR 3/4

Start date	13FEB06
Finish date	24NOV06
Data date	01AUG06
Run date	02AUG06
Page number	1B

© Primavera Systems, Inc.

MILLS PENINSULA HEALTH SERVICES
MILLS PENINSULA HOSPITAL PARKING STR

- Early bar
- Target bar
- Progress bar
- Critical bar
- Summary bar
- Start milestone point
- Finish milestone point

Act ID	Description	Original Duration	Early Start	Early Finish	Activity Owner	JUL 31	AUG 07	AUG 14	AUG 21	SEP 07	SEP 14	SEP 21	SEP 28	SEP 28
004545	REBAR/P.T. - L3 POUR 4/4	5	26AUG06	31AUG06	JJA									REBAR/P.T. - L3 POUR 4/4
004555	SLAB ON DECK INSPECTIONS - L3 POUR 4/4	1	31AUG06	31AUG06	TCCO									SLAB ON DECK INSPECTIONS - L3 POUR 4/4
004565	POUR SLAB ON DECK - L3 POUR 4/4	1	01SEP06	01SEP06	JJA									POUR SLAB ON DECK - L3 POUR 4/4
004575	CURE DECK (& 3D CYL BREAKS) - L3 POUR 4/4	3	05SEP06	07SEP06	JJA									CURE DECK (& 3D CYL)
004585	STRESS P.T. & INSPECTION - L3 POUR 4/4	1	08SEP06	08SEP06	JJA									STRESS P.T. &
004595	STRIP FORMWORK & RESHORE - L3 POUR 4/4	3	11SEP06	13SEP06	JJA									
GARAGE LEVEL 4 (ROOF) SLAB ON DECK														
POUR #1/4 DECK														
004600	FORM DECK - L4 POUR 1/4	4	23AUG06	28AUG06	JJA									FORM DECK - L4 POUR 1/4
004610	SURVEY CONTROL - L4 POUR 1/4	1	29AUG06	29AUG06	JJA									SURVEY CONTROL - L4 POUR 1/4
004620	EMBEDS - L4 POUR 1/4	3	30AUG06	01SEP06	JJA									EMBEDS - L4 POUR 1/4
004630	ELECTRICAL - L4 POUR 1/4	3	30AUG06	01SEP06	MM									ELECTRICAL - L4 POUR 1/4
004640	LAYOUT, INSERTS & SET DRAINS- L4 POUR 1/4	2	30AUG06	31AUG06	ACCO									LAYOUT, INSERTS & SET DRAINS- L4 POUR 1/4
004650	SET INSERTS - L4 POUR 1/4	1	30AUG06	30AUG06	WFP									SET INSERTS - L4 POUR 1/4
004660	REBAR/P.T. - L4 POUR 1/4	5	01SEP06	06SEP06	JJA									REBAR/P.T. - L4 POUR 1/4
004670	SLAB ON DECK INSPECTIONS - L4 POUR 1/4	1	06SEP06	06SEP06	TCCO									SLAB ON DECK INSPECTIONS -
004680	POUR SLAB ON DECK - L4 POUR 1/4	1	07SEP06	07SEP06	JJA									POUR SLAB ON DECK-
004690	CURE DECK (& 3D CYL BREAKS) - L4 POUR 1/4	3	08SEP06	12SEP06	JJA									
POUR #2/4 DECK														
004720	FORM DECK - L4 POUR 2/4	4	29AUG06	01SEP06	JJA									FORM DECK - L4 POUR 2/4
004730	SURVEY CONTROL - L4 POUR 2/4	1	05SEP06	05SEP06	JJA									SURVEY CONTROL - L4 POUR 2/4
004740	EMBEDS - L4 POUR 2/4	3	06SEP06	08SEP06	JJA									EMBEDS - L4 P
004750	ELECTRICAL - L4 POUR 2/4	3	06SEP06	08SEP06	MM									ELECTRICAL -
004760	LAYOUT, INSERTS & SET DRAINS- L4 POUR 2/4	2	06SEP06	07SEP06	ACCO									LAYOUT, INSERTS & SE
004770	SET INSERTS - L4 POUR 2/4	1	06SEP06	06SEP06	WFP									SET INSERTS - L4 POUR 2/4
004780	REBAR/P.T. - L4 POUR 2/4	5	07SEP06	12SEP06	JJA									
004790	SLAB ON DECK INSPECTIONS - L4 POUR 2/4	1	12SEP06	12SEP06	TCCO									
POUR #3/4 DECK														
004840	FORM DECK - L4 POUR 3/4	4	05SEP06	08SEP06	JJA									FORM DECK -
004850	SURVEY CONTROL - L4 POUR 3/4	1	11SEP06	11SEP06	JJA									
004860	EMBEDS - L4 POUR 3/4	3	12SEP06	14SEP06	JJA									
004870	ELECTRICAL - L4 POUR 3/4	3	12SEP06	14SEP06	MM									
004880	LAYOUT, INSERTS & SET DRAINS- L4 POUR 3/4	2	12SEP06	13SEP06	ACCO									
004890	SET INSERTS - L4 POUR 3/4	1	12SEP06	12SEP06	WFP									
POUR #4/4 DECK														
004845	FORM DECK - L4 POUR 3/4	4	11SEP06	14SEP06	JJA									
GARAGE ALL LEVELS														
02460	28 CD CURE PERIOD FOR L 2 P1 POUR STRIPS	20	01AUG06	28AUG06										28 CD CURE PERIOD FOR L 2 P1 POUR STRIPS
02470	POUR-BACK L 2 P1 POUR STRIPS	1	29AUG06	29AUG06										POUR-BACK L 2 P1 POUR STRIPS
005000	28 CD CURE PERIOD FOR L 2 P2 POUR STRIPS	20	01AUG06	28AUG06										28 CD CURE PERIOD FOR L 2 P2 POUR STRIPS
005010	POUR-BACK L 2 P2 POUR STRIPS	1	29AUG06	29AUG06										POUR-BACK L 2 P2 POUR STRIPS
005020	28 CD CURE PERIOD FOR L 2 P3 POUR STRIPS	20	01AUG06	28AUG06										28 CD CURE PERIOD FOR L 2 P3 POUR STRIPS
005030	POUR-BACK L 2 P3 POUR STRIPS	1	29AUG06	29AUG06										POUR-BACK L 2 P3 POUR STRIPS
005025	28 CD CURE PERIOD FOR L 2 P3 POUR STRIPS	20	04AUG06	31AUG06										28 CD CURE PERIOD FOR L 2 P3 POUR STRIPS
005035	POUR-BACK L 2 P4 POUR STRIPS	1	01SEP06	01SEP06										POUR-BACK L 2 P4 POUR STRIPS
005040	28 CD CURE PERIOD FOR L 3 P1 POUR STRIPS	20	14AUG06	11SEP06										
005050	POUR-BACK L 3 P1 POUR STRIPS	1	12SEP06	12SEP06										
005060	28 CD CURE PERIOD FOR L 3 P2 POUR STRIPS	20	22AUG06	20SEP06										
005080	28 CD CURE PERIOD FOR L 3 P3 POUR STRIPS	20	29AUG06	26SEP06										
005085	28 CD CURE PERIOD FOR L 3 P3 POUR STRIPS	20	05SEP06	02OCT06										
005100	28 CD CURE PERIOD FOR L 4 P1 POUR STRIPS	20	08SEP06	05OCT06										
GARAGE BUILDING EXTERIOR														
005160	Erect Arch. Precast Panels @ Pour 1 Strips	2	30AUG06	31AUG06										Erect Arch. Precast Panels @ Pour 1 Strips
005170	Erect Arch. Precast Panels @ Pour 2 Strips	2	01SEP06	05SEP06										Erect Arch. Precast Panels @ Pour 2 Strips
005180	Erect Arch. Precast Panels @ Pour 3 Strips	2	06SEP06	07SEP06										Erect Arch. Precast Panels @ Pour 3 Strips
005190	Layout Glass Alum - Col A-5	5	01SEP06	06SEP06										Layout Glass Alum - Col A-5

Start date 13FEB06
 Finish date 28NOV06
 Data date 01AUG06
 Run date 02AUG06
 Page number 2A

MILLS PENINSULA HEALTH SERVICES
 MILLS PENINSULA HOSPITAL PARKING STR

- Early bar
- Target bar
- Progress bar
- Critical bar
- Summary bar
- ◆ Start milestone point
- ◆ Finish milestone point

BREAKS) - L3 POUR 4/4
 INSPECTION - L3 POUR 4/4
 STRIP FORMWORK & RESHORE - L3 POUR 4/4

L4 POUR 1/4
 L4 POUR 1/4
 CURE DECK (& 30 CYL BREAKS) - L4 POUR 1/4

OUR 2/4
 L4 POUR 2/4
 T DRAINS- L4 POUR 2/4
 REBAR/P.T. - L4 POUR 2/4
 SLAB ON DECK INSPECTIONS - L4 POUR 2/4

L4 POUR 3/4
 SURVEY CONTROL - L4 POUR 3/4
 EMBEDS - L4 POUR 3/4
 ELECTRICAL - L4 POUR 3/4
 LAYOUT, INSERTS & SET DRAINS- L4 POUR 3/4
 SET INSERTS - L4 POUR 3/4
 FORM DECK - L4 POUR 3/4


28 CD CURE PERIOD FOR L 3 P1 POUR STRIPS
 POUR-BACK L 3 P1 POUR STRIPS
 28 CD CURE PERIOD FOR L 3 P2 POUR STRIPS
 28 CD CURE PERIOD FOR L 3 P3 POUR STRIPS
 28 CD CURE PERIOD FOR L 3 P3 POUR STRIPS
 28 CD CURE PERIOD FOR L 4 P1 POUR STRIPS

is @ Pour 3 Steps

Start date 13FEB06
 Finish date 24NOV08
 Data date 01AUG06
 Run date 02AUG06
 Page number 28
 © Primavera Systems, Inc.


MILLS PENINSULA HEALTH SERVICES
 MILLS PENINSULA HOSPITAL PARKING STR

Early bar
 Target bar
 Progress bar
 Critical bar
 Summary bar
 Start milestone point
 Finish milestone point

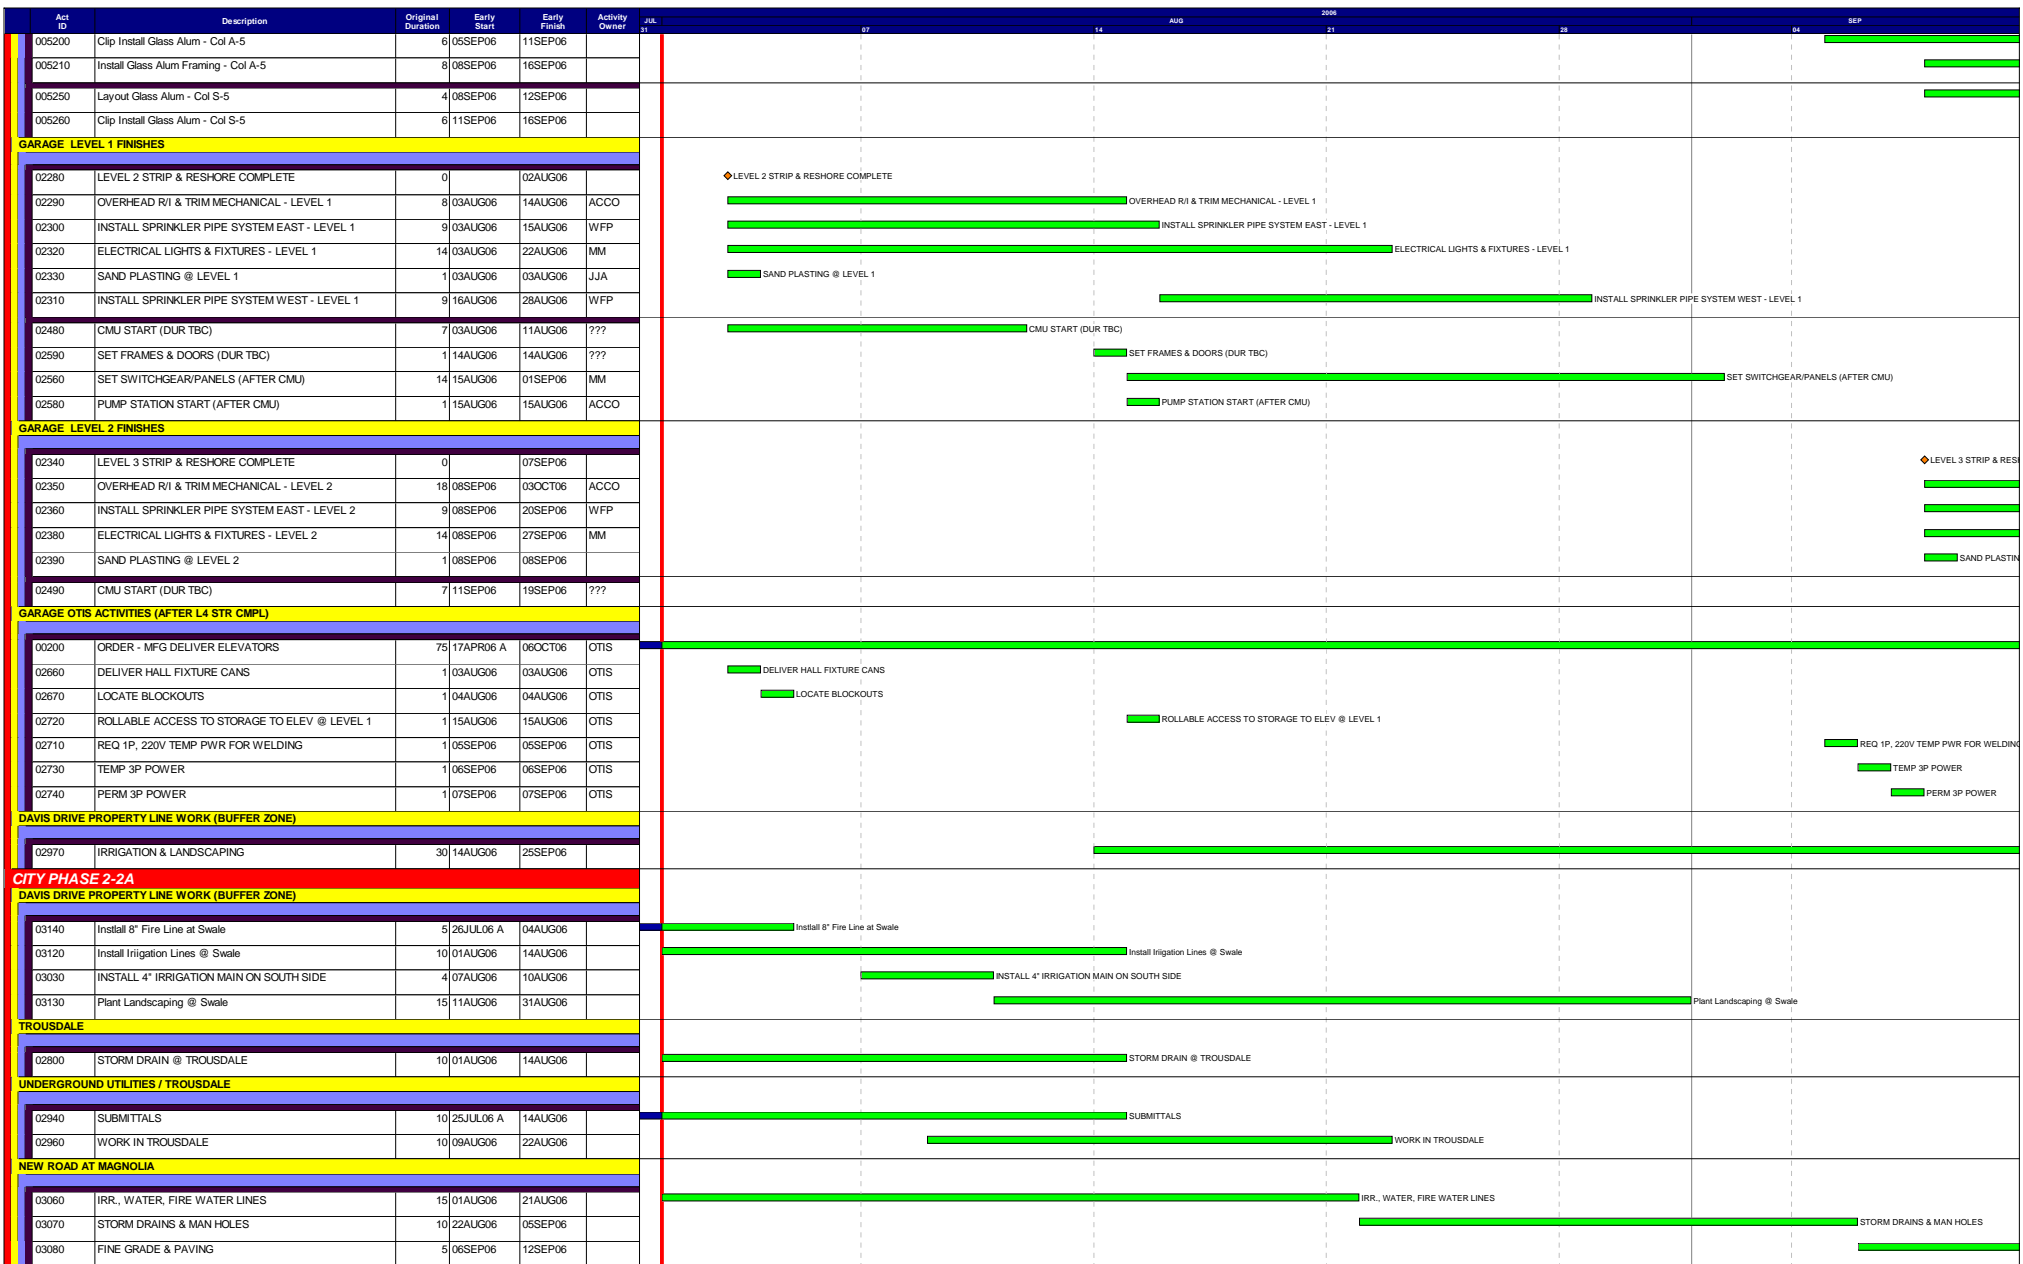

Start date 13FEB06
 Finish date 24NOV08
 Data date 01AUG06
 Run date 02AUG06
 Page number 3A

Early bar
 Target bar
 Progress bar
 Critical bar
 Summary bar
 Start milestone point
 Finish milestone point

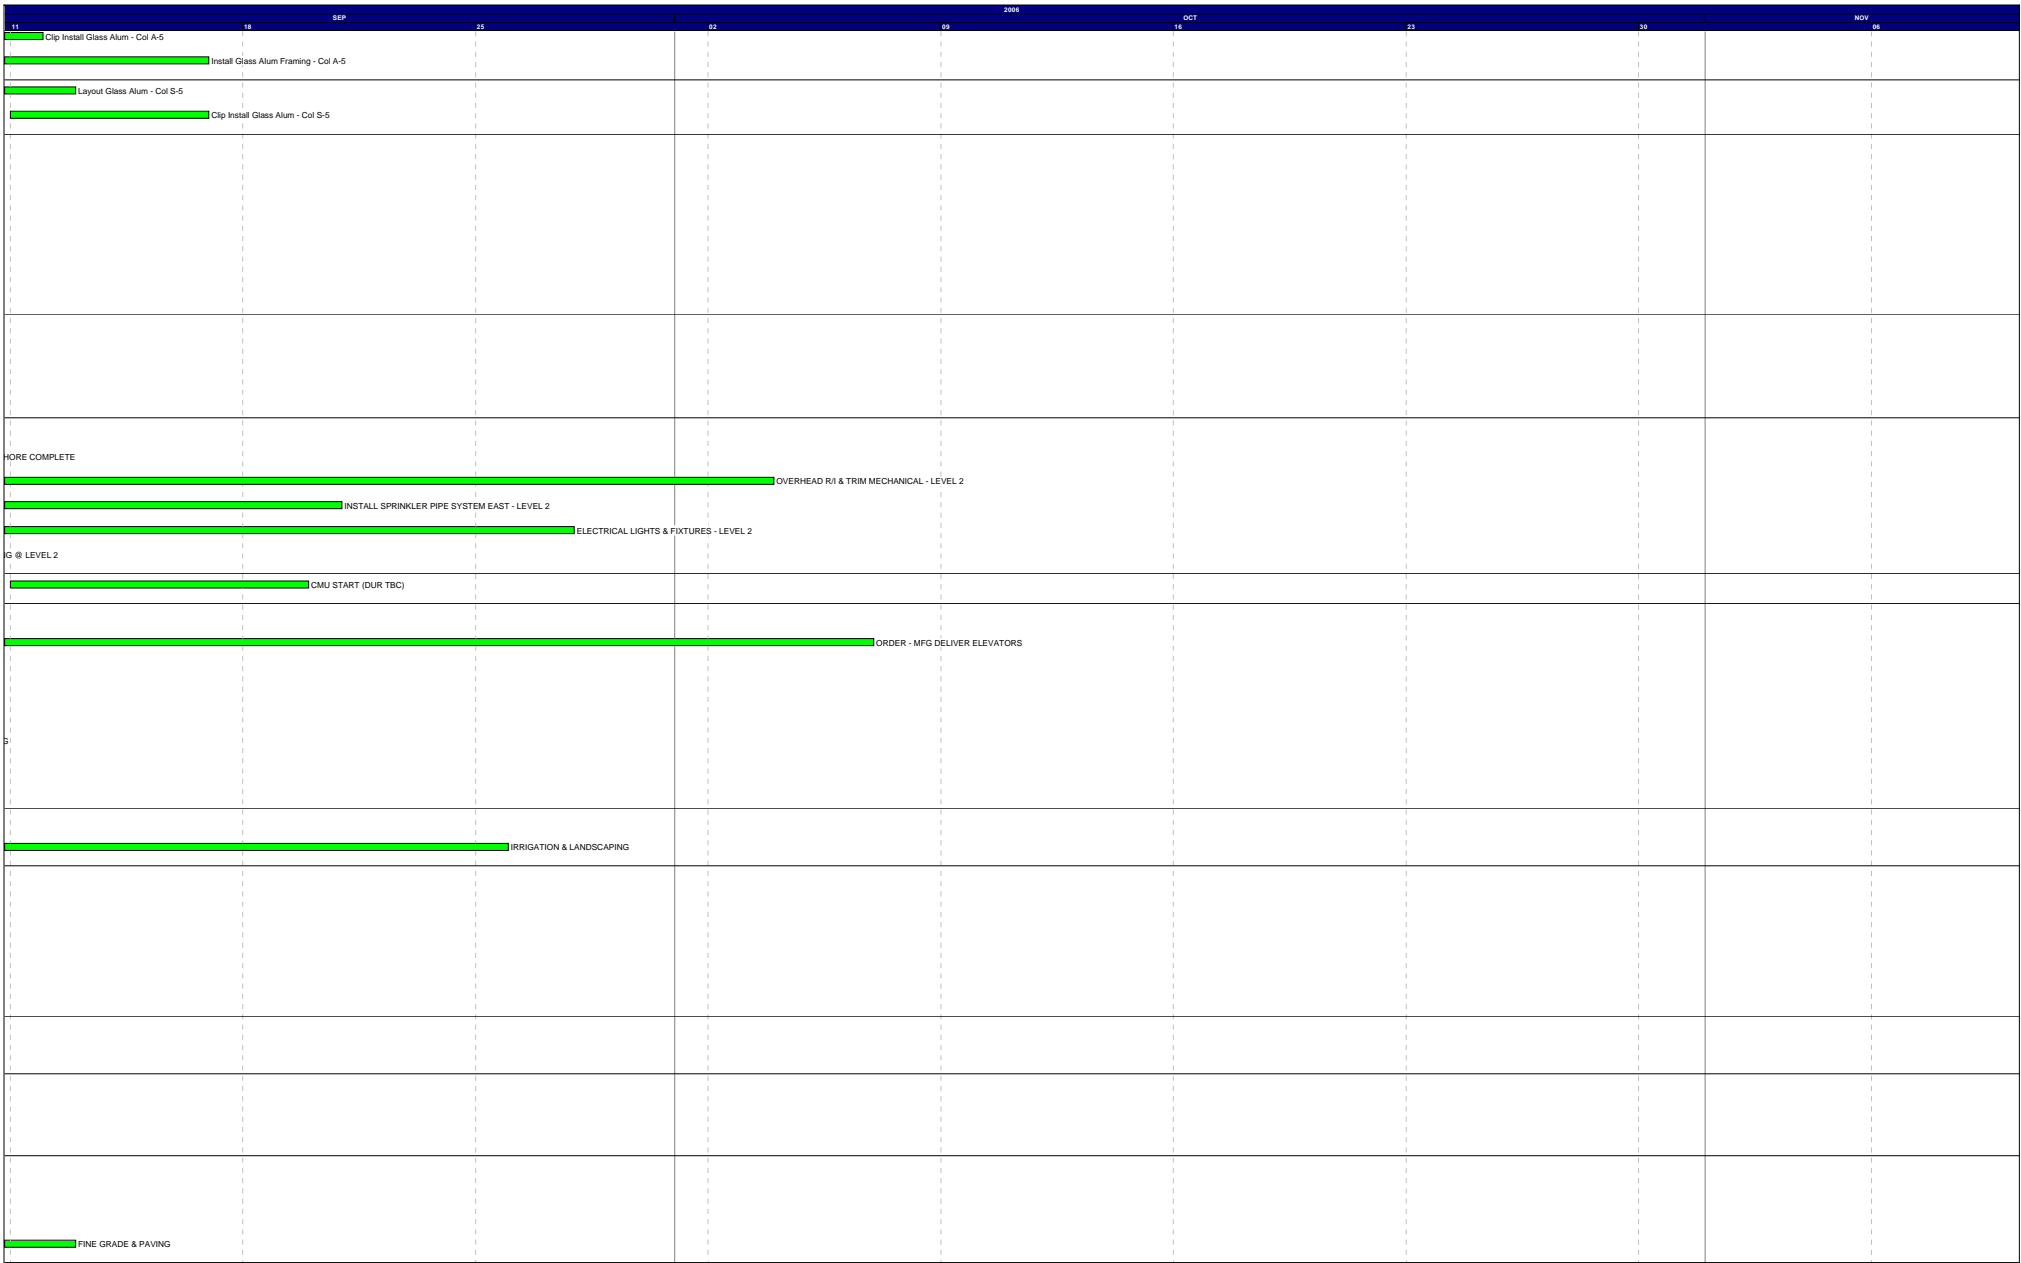

Start date 13FEB06
 Finish date 24NOV08
 Data date 01AUG06
 Run date 02AUG06
 Page number 38

© Primavera Systems, Inc.

MILLS PENINSULA HEALTH SERVICES
 MILLS PENINSULA HOSPITAL PARKING STR

Early bar
 Target bar
 Progress bar
 Critical bar
 Summary bar
 Start milestone point
 Finish milestone point
